


## *Чараёни иҷрои корҳо дар Неругоҳи барқи оби Роғун (январ-март соли 2024)*

Гидроагрегатҳои №5 ва №6-и Неругоҳ аз ибтидо то 03.04.2024 ба миқдори **3 448 899 090 кВт\*соат** нерӯи барқ тавлид намуданд.

Ба системаи энергетикӣ ШСХК “Барқи Тоҷик” аз аввали ба истифодадихӣ **7 289 637 560 кВт\*соат** нерӯи барқ интиқол гардид.

Дар се моҳи соли ҷорӣ гидроагрегатҳои №5 ва №6 ба миқдори **340 474 680 кВт\*соат** нерӯи барқ истеҳсол намуданд.

Аз ҷумла, ба системаи энергетикӣ ҚСК “Барқи Тоҷик” дар давоми се моҳ ба миқдори **336 485 000 кВт\*соат** нерӯи барқ содирот гардидааст.

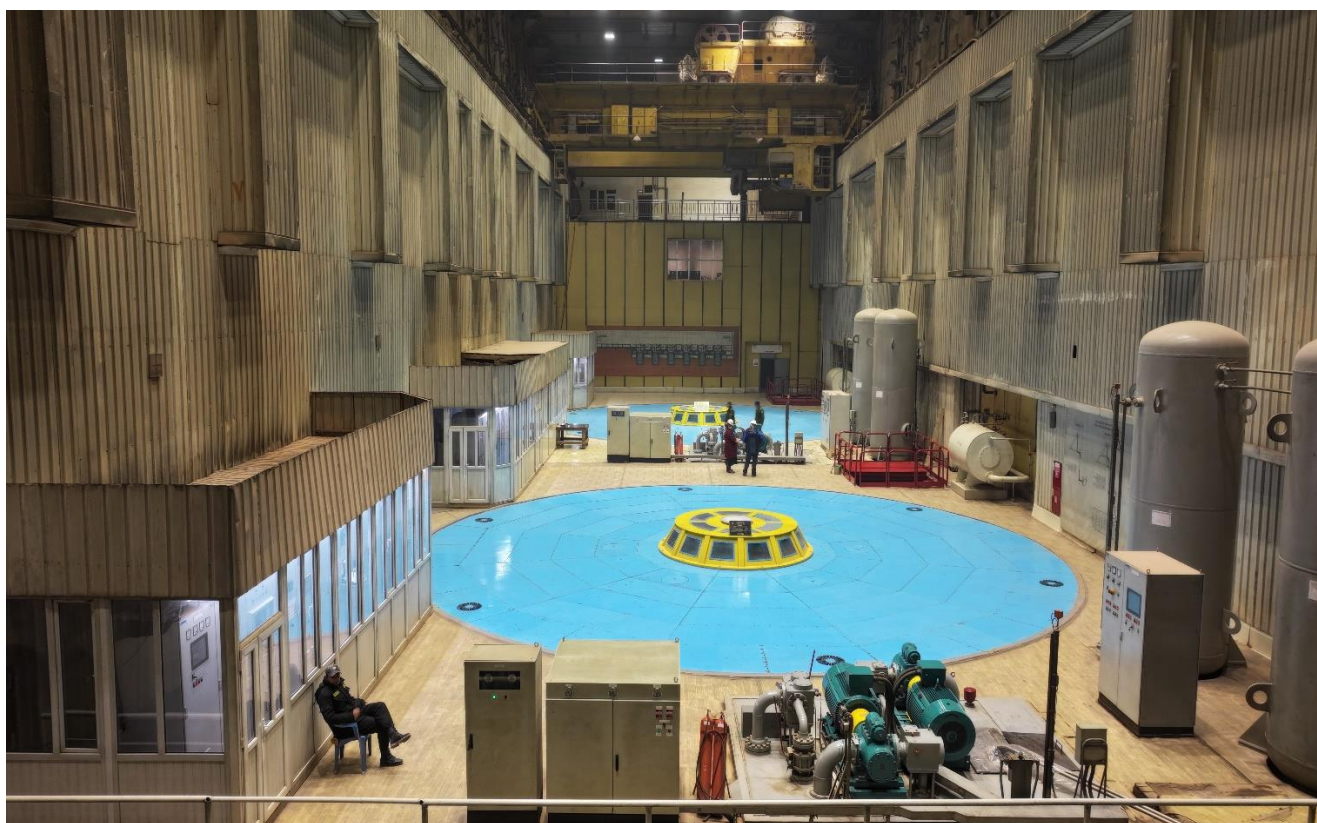

*Расми 1. Ҳолати кории гидроагрегатҳои №6 ва №5.*



## Иҷрои корҳои сохтмони ширкати “ВИБИЛД” дар моҳи январ-март соли 2024.

### Сохтмони сарбанд.

Корҳои хобонидани маводи шағалзамин дар зонаи - 4 қисмати болоии таҳкурсии ядроӣ сарбанд то сатҳи 998м иҷро гардида, дар ҳаҷми – **85110 м<sup>3</sup>** мавод хобонида шудааст.

Хобонидани маводи шағал дар зонаи 4 ва маводи филтр дар зонаҳои 2 ва 3 қисмати поёнии таҳкурсии ядроӣ сарбанд дар сатҳҳои 1004м-1011м идома дошта, дар се моҳи соли ҷорӣ дар ҳаҷми – **306911м<sup>3</sup>** мавод хобонида шудааст.



*Расми 2. Сарбанди Неругоҳи Роғун.*

### Ядроӣ сарбанди асосӣ.

Корҳои сементатсияи мустаҳкамкунии паҳлуи чап ва ростии ядроӣ сарбанд то сатҳи 1080м бо сабаби идомаи корҳои тозакунии паҳлуи ростии куҳ муваққатан қатъ гардида, аз 4255-адад чоҳҳо 551-адад парма ва сементатсия карда шуданд.

Корҳои тозакунии паҳлуи ростии куҳ дар минтақаи ядроӣ сарбанд идома дошта, то сатҳи 1055м-1045м иҷро гардидаанд.







*Расми 3. Тозакунии паҳлуи рости куҳ дар минтақаи ядрои Сарбанд.*

### **Нақби сементатсионии GG-1L**

Корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда дар нақби сементатсионии GG-1L бо шумораи 706 адад чоҳҳо ба анҷом расид.

Корҳои сементатсияи пардаи оббанд (цементационная завеса) дар нақби сементатсионии GG-1L идома дошта, аз 24472 метри тулонӣ мувофиқи лоиҳа, 22267,2 метри тулонӣ парма ва сементатсия карда шуд.

### **Нақби сементатсионии GG-1C**

Корҳои сементатсияи пардаи оббанд (цементационная завеса) дар нақби мазкур идома дошта, аз 19059 метри тулонӣ мувофиқи лоиҳа, 8364,6 метри тулонӣ парма ва сементатсия гардид.

### **Нақби сементатсионии GG-1R**

Корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда дар нақби мазкур идома дошта, аз 408 адад чоҳҳо тибқи лоиҳа, 114 адад парма ва сементатсия карда шуданд.

### **Нақби сементатсионии GG-2L**

Корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонии сақфу девор идома дошта, дар се моҳи соли ҷорӣ дар тули 60м дар ҳаҷми 1013м<sup>3</sup> бетон хобонида шуд.



Корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонии марҳилаи 2-юми қисмати каф идома дошта, дар тули 52м дар ҳаҷми 95м<sup>3</sup> бетон хобонида шуд.

#### **Нақби сементатсионии GG-1R**

Корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонии сақфу девор идома дошта, дар се моҳи соли қорӣ дар тули 36м дар ҳаҷми 828м<sup>3</sup> бетон хобонида корҳои арматурбандӣ идома дорад.

Корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонии марҳилаи 2-юми қисмати каф идома дошта, дар тули 111м дар ҳаҷми 71м<sup>3</sup> бетон хобонида шуд.

Корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонии марҳилаи 1-юми қисмати каф ба анҷом расида, дар тули 12м дар ҳаҷми 184м<sup>3</sup> бетон хобонида шуд.

#### **Нақби сементатсионии GG-2R**

Корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонии сақфу девор ба анҷом расида, дар дар тули 21м дар ҳаҷми – 325м<sup>3</sup> бетон хобонида шуд.

Корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонии марҳилаи 2-юми қисмати каф ба анҷом расида, дар тули 63м дар ҳаҷми 76м<sup>3</sup> бетон хобонида шуд.

Корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда дар нақби мазкур идома дошта, аз 220 адад чоҳҳо тибқи лоиҳа, 167 адад парма ва сементатсия карда шуданд.

#### **Нақби сементатсионии GG-3R.**

Корҳои нақбкани бетонхобонии бетони аввалияи қисмати каф тибқи лоиҳа дар тули 122,0м то ПК01+22,40 ба анҷом расида, корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонии қисмати каф бо сабаби иваз гардидани лоиҳа муваққатан қатъ гардидааст.

#### **Чорабиниҳои барҳамдиҳии нақбҳо.**

#### **Барҳамдиҳии нақбҳои ТМ-2, Р-4. ТИСС/Т-2**

Корҳои барҳамдиҳии нақбҳо идома дошта, дар се моҳи соли қорӣ дар ҳаҷми 3439м<sup>3</sup> бетон хобонида шудааст.

### **Иншооти соҳили рост (ЛОТ-и 3)**

#### **Нақби сохтмони қабати чорум (СТ-4) ва нақбҳои дастрасии он**

Ба иншооти Лоти 3 нақбҳои сохтмони қабати чорум (СТ-4) дар сатҳи миёнаи обанбор бо нақбҳои дастрасӣ, ҳавокаш ва нақлиётӣ, нақбҳои обпартои ВТВУ-1 ва ВТВУ-2 дар сатҳи болоии обанбор, нақбҳои обпартои сатҳӣ ПТВ-1 ва ПТВ-2, таҷҳизоти гидромеханикии нақбҳои обпарто, нақбҳои сементатсионии G1R, G2R, G3R, G4R, G5R, G6R бо нақбҳои дастрасӣ ба онҳо, нақбҳои нақлиётӣ Т-23, Т-23А, Т-





39, Т-39А, ТТ-2, ТСА-1, роҳи мошингард аз заводи бетони №1 то нақби Т-23, пули мошингарди “Ж” мансуб мебошад. Дар асоси қарордоди Лоти 3 корҳои лоиҳакашӣ дар иншооти мансуб ба Лоти 3 аз тарафи ширкати “AFRY”-и Ҷумҳурии Шветсария иҷро шуда, корҳои сохтмонӣ васлгарӣ аз ҷониби пудратчии Лоти 3 ҶСК “Тоҷикгидроэлектромонтаж” идома дорад. Дар қисмати баромадгоҳи нақби сохтмони қабати чаҳорум (СТ-4) корҳои таркишӣ ва хокбардорӣ, мустаҳкамкории канораҳои кӯҳ ва пошидани маҳлули бетонӣ, гузоштани анкерҳои АЖГ идома дорад.

Дар нақбҳои нақлиёти Т-23, корҳои нақбкани ва хобонидани бетони конструктивӣ иҷро шуда истодаанд.

Дар нақбҳои нақлиёти Т-39 ва Т-39А, корҳои нақбкани ва мустаҳкамкорӣ ба иҷро мерасанд.

Корҳои ҳаффории нақбҳои дастрасии сементатсионии АГ2R, нақби сементатсионии G-1R ва G-3R соҳили рост ба анҷом расидааст.



*Расми 4. Баромадгоҳи нақбҳои сохтмони СТ-3 ва СТ-4.*

### **Иншооти соҳили чап (ЛОТ-и 4)**

#### **Обқабулкунаки доимӣ**

Корҳои хокбардорӣ ва мустаҳкамкорӣ дар (қисмати-D) обқабулкунакҳои асосӣ, аз сатҳи 1 152 то 1570 метр идома дошта,





корҳои пошидани маҳлули бетонӣ, гузоштани анкерҳои ПНА, АЖГ ва хобонидани бетони конструктиви девораҳо аз сатҳи 1150 то сатҳи 1190м (қисмати С) иҷро гардида истодаанд.

Дар иншооти камераи васлгари турбинаҳо, сатҳи 1171м, корҳои хобонидани бетони конструктиви девораҳо ба анҷом расида, ду адад крани борбардор васлу насб ва ба кор омода карда шуд. Дар ин толор айна замон корҳои бетонхобонии қисмати каф дар мавзёи шахтаҳои обрасони агрегатҳои №5 ва №6 давом мекунад.



*Расми 5. Ҷараёни корҳо дар обқабулкунакҳои доимӣ.*

Дар шахтаҳои обрасони №2-№6 иҷрои корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда идома дорад. Дар шахтаи обрасони №1 корҳои кушодсозӣ ва мустаҳкамкорӣ давом мекунад. Дар қисмати горизонталии поёни нақбҳои обрасони 1-3 низ иҷрои корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда иҷро гардида истодаанд.

### **Биҳои трансформаторҳо**

Корҳои сементатсияи мустаҳкамкунандаи девораҳо дар ин иншоот анҷом ёфта, айна замон иҷрои корҳои пармагари чохҳои санҷишӣ идома дорад. Корҳои хобонидани бетони конструктивӣ дар минтақаи





агрегатҳои 1-3-и Бинои трансформаторҳо баъди таҳияи лоиҳаҳо аз нав оғоз гардиданд.

### **Толори мошинҳо**

Дар мавзеи агрегати №2 Толори мошинҳо қорҳои хобонидани бетони конструктивии атрофи конус идома дошта, дар мавзеи агрегати №1 қорҳои нақбкани, мустаҳкамқорӣ ва гузоштани анкерҳои АЖГ-и дарозиашон 20,2м иҷро гардида истодааст. Дар нақбҳои ҷаббандаи №1-2 қорҳои насби оҳанфулузот ва бетонхобонӣ иҷро гардида, дар нақби ҷаббандаи №3 иҷрои қорҳои микросементатсияи оҳанфулузот идома дорад.

Қорҳои нақбкани ва бетонхобонӣ дар нақбҳои сементатсионии G2L, G3L ва G4L соҳили чап давом мекунанд.



*Расми 6. Арматурбандии атрофи конуси агрегати №3.*

**Ҳаҷми иҷрои қорҳои сохтмонӣ дар моҳҳои январ-марти соли 2024.**

<b>№ р/т</b>	<b>номгуи қорҳо</b>	<b>Воҳиди ченак</b>	<b>Нақша</b>	<b>Иҷроиш</b>	<b>Фарқият бо фоиз</b>
--------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------	------------------------



1	Корҳои заминӣ	м <sup>3</sup>	944 548	772 469	82%
2	Корҳои нақбкани	м <sup>3</sup>	69 216,6	48 621,7	70%
3	Корҳои бетонхобонӣ	м <sup>3</sup>	74 128,2	32 507,2	44%
4	Корҳои бетонпошӣ	м <sup>2</sup>	64 157,3	36 571,3	57%
5	Сементатсияи мустақкамкунанда	м/т	33 792,7	11 355	34%
6	Сементатсияи пуркунанда	м <sup>2</sup>	12 730,06	9 538	75%
7	Васли анкерҳои оҳану бетонӣ	м/т	132 410,5	80 537,4	61%

**Истеҳсоли маводи инертӣ, омехтаи бетон ва воридоти семент дар давоми се моҳи соли 2024.**

Моҳҳо	Истеҳсоли омехтаи бетон (м <sup>3</sup> )	Истеҳсоли маводҳои инертӣ (м <sup>3</sup> )	Воридоти семент (тн)
январ	6 358	18 138	1 447
феврал	4 688	12 016	9 689
Март	17 646	18 387	13 266
<b>Ҷамагӣ дар давоми се моҳ</b>	<b>28 692</b>	<b>48 541</b>	<b>24 402</b>

**Корҳои васлу насб ва ченкунии асбобҳои санҷишию ченкунии дар давоми се моҳи соли 2024**

№ т/б	Номгуи иншоотҳо ва қитъаи корӣ	Намуди кор	Воҳиди ченак	Ҳаҳми корҳои ихрошуда дар семоҳаи аввали соли 2024	Ҳаҳми корҳои ихрошуда аз аввали соли 2023 то инҳониб
1	Бинои	Ченкунии	адад	8066	36151





	трансформаторҳо аз буришҳои 7-10	АСЧ дар утоқи оперативии Толори мошинҳо	нишондод		
	Коллетори агрегатҳои 1-6				
	Кубурҳои ҳаббанда А1-3				
2	Бинои таъмирии СТ-1 ва СТ-2	Ченкунии АСЧ	адад нишондод	596	2708
3	Нақбҳои сохтмони СТ-1, СТ-2	Ченкунии АСЧ	адад нишондод	8121	60588
4	Нақби захкаший-сементатсионии ДЦШ-1 и 2	Ченкунии АСЧ	адад нишондод	930	3667
5	Утоқи оперативии сатҳи 980м (Толори мошинҳо буришҳои 1-6; Бинои трансформаторҳо аз буришҳои 1-6; Турбинаҳои обқабулкуни А5-6; Камераҳои спирали А5-6; Кубурҳои ҳаббанда А4-6)	Ченкунии АСЧ	адад нишондод	13981	88298
6	Толори мошинҳо аз буриши 6-13	Ченкунии АСЧ	адад нишондод	6883	25123
7	Камераи спирали А4	Ченкунии АСЧ	адад нишондод	1065	5949
8	Нақби сохтмони СТ-3 (минтақаи дарвозаҳо); Шахтаи таъмири дарвозаҳои садамавӣ (АРЗ)-и СТ-3; Баромадгоҳи	Ченкунии АСЧ	адад нишондод	5431	27042



	нақби СТ-3				
9	Биной васлгари (Монтажная камера); Нақбҳои чараёнгузари (Токопровод) А1÷4; Тақия болорҳои 4-6-и Толори мошинҳо; Нақби нақлиётии Т-8; Тақиядеворҳои КРУЭ; Нақби сохтмони СТ-4;	Ченкунии АСЧ	адад нишондод	2898	25076
10	Пармачоҳҳои пезометрии минтақаи НБО Роғун	Ченкунии сатҳ ва ҳарорати обҳои зеризаминӣ	адад нишондод	109	684
11	Дар утоқи корӣ	Таҳлил баррасӣ намудани маълумотҳо и мониторинг ӣ	адад нишондод	835409	1367669
	<b>Ҳамагӣ</b>		<b>адад нишондод</b>	<b>883489</b>	<b>1642955</b>

Айни ҳол дар сохтмони НБО “Роғун” **15 869** нафар коргарон ва кормандони муҳандисиву техникӣ фаъолият доранд, ки **866** нафари онҳоро мутахассисони хориҷӣ ташкил дода, дар ду вахта ва бастҳои кори шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд. Аз ин тӯлдод кормандони ширкати “Вибилд” **1 610** нафарро (хориҷӣ-**168** нафар, ватанӣ **1 442** нафар) ташкил медиҳанд. Шумораи мошину механизмҳо ба **3 562** адад расидааст.

